

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICH.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



CARATULA DE ESTIMACIÓN		ESTIMACION No.		2 FIN (DOS FINIQUITO)	
		FECHA	27 de abril de 2023		
		INICIO	1 de abril de 2023		
		TERMINO	27 de abril de 2023		
OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"				
LOCALIDAD	EL DEVANADOR DE RIVERA				
CONTRATO NO.	MTM/POA/2023/FED/53-AD-22				
FECHA CONTRATO	13 de marzo de 2023				
FECHA INICIO CONTRATO	14 de marzo de 2023				
FECHA TÉRMINO CONTRATO	30 de junio de 2023				
FECHA T. CONV. MODIF./RECAL					
FECHA T. PRORROGA					
ESTIMADO	\$	155,027.71	CONTRATADO	\$	384,129.53
IVA	\$	24,804.43	AMPLIACION	\$	-
TOTAL ESTIMADO	\$	179,832.14	INCREMENTOS	\$	-
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	-	TOTAL	\$	384,129.53
TOTAL	\$	179,832.14	ANTICIPO	\$	-
% VERIFICACIÓN	\$	-	AMORT. ANTERIOR	\$	-
% OTRAS DEDUCCIONES	\$	-	AMORT. ESTA ESTIM.	\$	-
0.5% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$	775.14	AMORT. TOTAL	\$	-
ALCANCE LÍQUIDO	\$	179,057.00	POR AMORTIZAR	\$	-
<div><div><div><p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</p><p>M.A. JOSÉ MANUEL PÉREZ ÁVILES</p><p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p><p>UNIDAD Y COMPROMISO</p></div><div><p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</p><p>L.I. KARENY GUSTEL SOLÍS MIRANDA</p><p>TESORERO MUNICIPAL</p><p>UNIDAD Y COMPROMISO</p></div><div><p>CONTRALORIA</p><p>TZITZIO, MICH.</p><p>2024 - 2024</p><p>UNIDAD Y COMPROMISO</p></div></div><div><p>C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS</p><p>DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</p><p>Y OBRAS PÚBLICAS</p><p>ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO</p><p>PERSONA FÍSICA</p></div></div>					

RESUMEN		CONTRATADO		ACUMULADO	
		ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	
CONTRATADO	\$384,129.53	\$204,297.39	\$179,832.14	\$384,129.53	
TOTAL	\$384,129.53	\$204,297.39	\$179,832.14	\$384,129.53	
SANCIÓN					

AVANCES		FINAN	
		FÍSICO	FINAN
	\$0.00	100.00%	100.00%
	\$0.00	100.00%	100.00%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICH.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

OBRA:	LOCALIDAD:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+285 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"	CONTRATO: MT/PM/PA/2023/FED/53-AD-22		ESTIMACIÓN:		2 FIN (DOS FINIQUITO)		PERIODO:	
			MONTO:	\$384,129.53			27/04/2023			
2 FIN (DOS FINIQUITO)										
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			VOLUMEN ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	IMPORTE ACUMULADO	VOLUMEN POR ESTIMAR	IMPORTE POR ESTIMAR
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.						
PAVIMENTACIÓN										
01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO, TOPOGRÁFICO DIGITAL ESTACIÓN TOTAL Y/O NIVEL MONTADO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CAMINOS, ETC. INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y MARCADO BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS CUANDO SE REQUIERA, ESTACAS, SEÑALAMIENTO, CHAPONEO MENOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	196.00	\$11.25	\$2,205.00	0.00	\$0.00	196.00	\$2,205.00	\$0.00
01-002	EXCAVACIÓN MANUAL Y/O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO.	M3	127.40	\$121.52	\$15,481.65	0.00	\$0.00	127.40	\$15,481.65	\$0.00
01-003	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO EN TERRENO CLASE I CON MATERIAL (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0% ROCA) PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS.	M2	196.00	\$39.77	\$7,794.92	0.00	\$0.00	196.00	\$7,794.92	\$0.00
01-004	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, CARGA CON MÁQUINA.	M3	165.62	\$361.21	\$59,823.60	0.00	\$0.00	165.62	\$59,823.60	\$0.00
01-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO (4" A 1"), TENDIDO Y ACOMODO EN CAPAS NO MAYORES A 20CM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	58.80	\$920.61	\$54,131.87	0.00	\$0.00	58.80	\$54,131.87	\$0.00
01-006	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO A 95% DE SU PVS/M MEZCLA A BASE DE MATERIAL EN GREÑA Y TEPETATE 70/30 CON EQUIPO MECÁNICO CAPA DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, AGUA Y EXTENDIDO.	M3	39.20	\$935.75	\$36,681.40	0.00	\$0.00	39.20	\$36,681.40	\$0.00
07-010	CONCRETO HECHO EN OBRA REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10 Y ACABADO RAYADO, TIRO DIRECTO, RESISTENCIA F' C=250 KG/CM2 Y REVENIMIENTO DE 10 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, VIBRADO, HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA, CORTE AL DÍA SIGUIENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	29.40	\$5,024.68	\$147,725.59	29.40	\$147,725.59	29.40	\$147,725.59	\$0.00
09-001	LETRERO INFORMATIVO DE TERMINACIÓN DE OBRA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA	PZA	1.00	\$7,302.12	\$7,302.12	1.00	\$7,302.12	1.00	\$7,302.12	\$0.00





# NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"



MTM/POA/2023/FED/53-AD-22

CLAVE: 07-010

UNIDAD: M3

HOJA:

CONCRETO HECHO EN OBRA REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO RAYADO, TIRO DIRECTO, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 Y REVENIMIENTO DE 10 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, VIBRADO, HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA, CORTE AL DÍA SIGUIENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TRAMO		LONGITUD	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
0+255	0+265	10.00	7.00	0.15	M3	10.50	
0+265	0+274	9.00	7.00	0.15	M3	9.45	
0+274	0+283	9.00	7.00	0.15	M3	9.45	
TOTAL						29.40	


CROQUIS

07-010
M3 29.40

## SECCIÓN TIPO

7.00

0.15

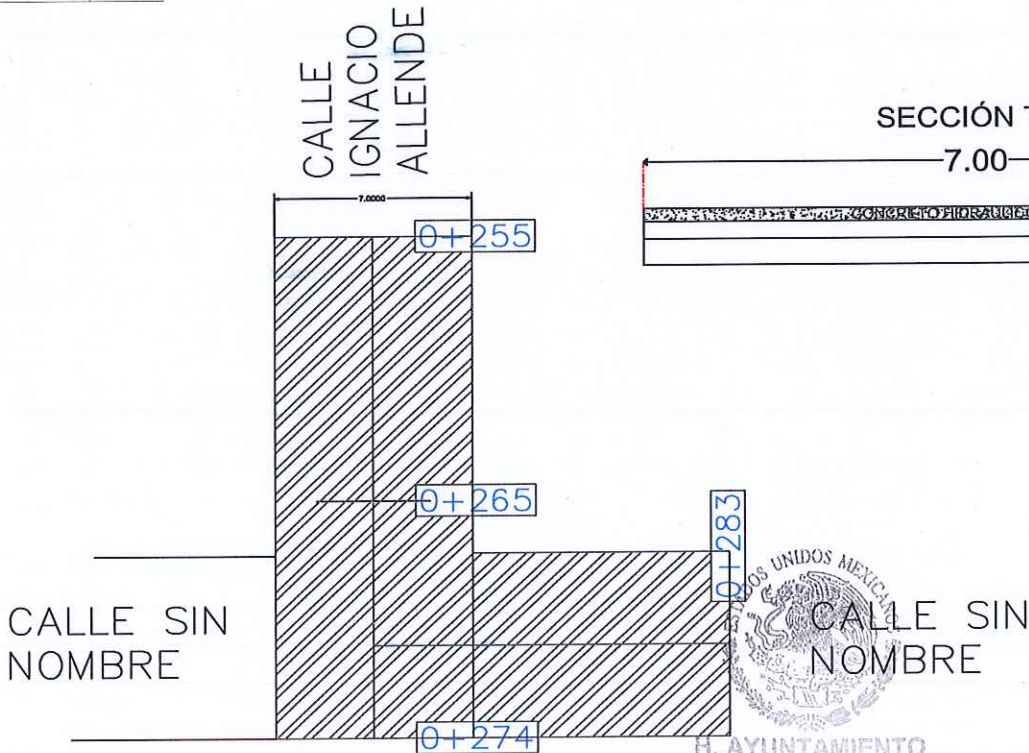

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y URBANISMO

TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024

UNIDAD Y COMPROMISO

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

1 DE 2

ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

## NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA  
TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"**



MTM/POA/2023/FED/53-AD-22

CLAVE: 09-001

UNIDAD: PZA


**HOJA :**

GENERADOR DE: LETRERO INFORMATIVO DE TERMINACION DE OBRA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA

[illegible]

C R O Q U I S

09-001	
PZA	1.00

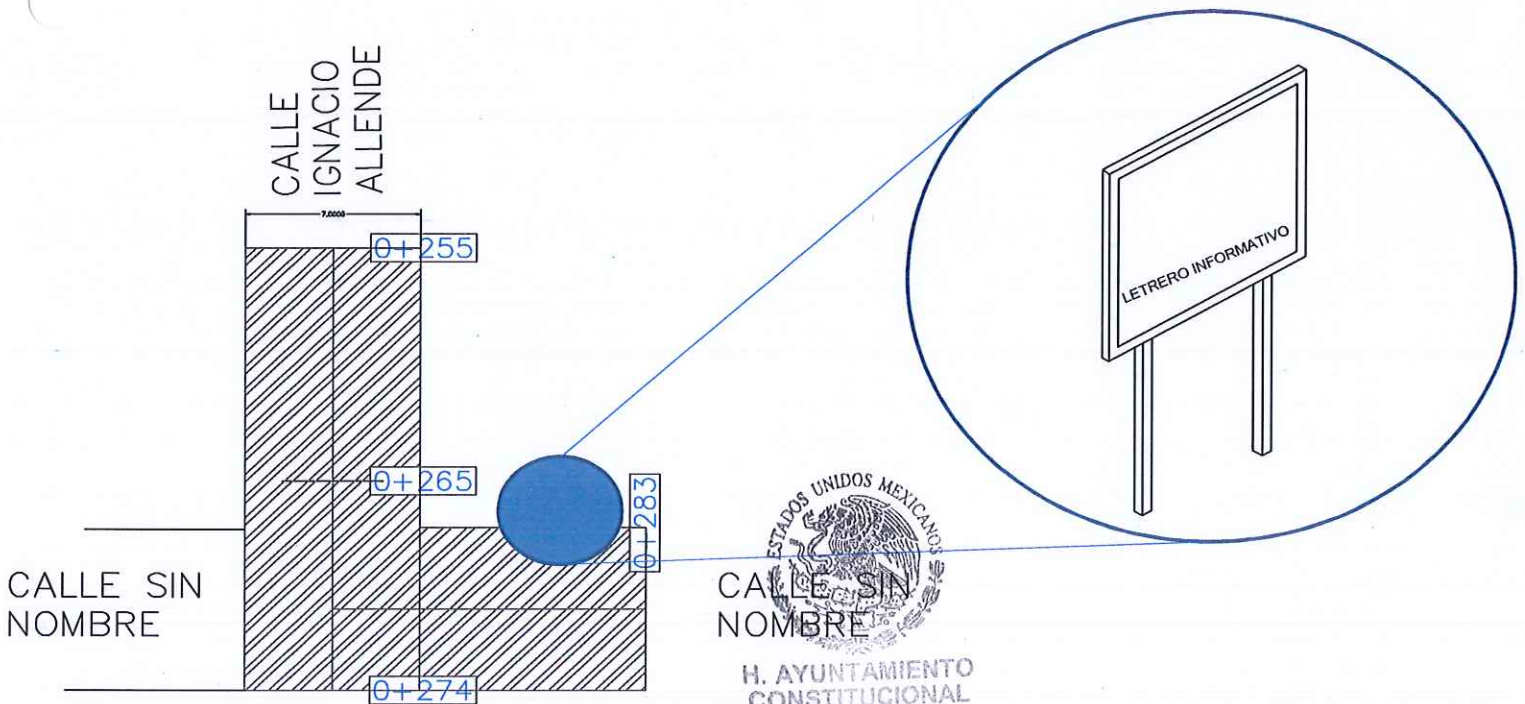

CALLE SIN  
NOMBRE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y URBANISMO  
ZIZIQU, MICH.  
2021 - 2024

UNIDAD Y COMPROMISO

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

2 DE 2

ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA



[illegible]

## "UNIDAD Y COMPROMISO"

Fecha:

14 MARZO 2023

No.

01

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 122, 130, 131, 132, 133 Y 134 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS CON ESTA FECHA SE ABRENTA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA RELATIVA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NOMINUM/POA/1693/FED/53-AD-22 QUE CON FECHA 13 DE MARZO DE 2023, CELEBRÓ EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIZITIO MICHOACÁN, CON LA PERSONA FÍSICA CONTRATISTA, ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANNO POR UN PLEITO DE \$384,129.53 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VENTINUEVE PESOS 53/100 MXN), INCLUYENDO EL IVA Y QUE AMPLIA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+2.55 KM AL 0+2.83 KM EN LA TENENCIA DEL DEVENADOR DE RIVERA DEL MUNICIPIO DE TIZITIO, MICHOACÁN" CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023.

LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA ASENTAR NOTAS EN LA PRESENTE BITÁCORA SON:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TIZITIO

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ RIVERA

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS Y RESIDENTE DE LA OBRA, ASIGNADO SEGÚN EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, EL CUAL SE LE DENOMINARÁ SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANNO

RESIDENTE DE OBRA ASIGNADO POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OFICIO PRESENTADO DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2023, EL CUAL SE LE DENOMINARÁ EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

PARA EL USO DE LA SIGUIENTE BITÁCORA, ESTARÁ DISPONIBLE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HRS. EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS SOBRE LA CALLE ALLENDE SIN, EN EL CENTRO DE TIZITIO, MICHOACÁN.

LOS PLAZOS DE ACEPTACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS NOTAS SERÁN DE 2 DÍAS HÁBILES Y NO QUEDARÁN CONSIDERADAS, AQUELLAS SOLICITUDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS O VOLÚMENES DISTINTOS A LOS CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS Y LOS CAMBIOS A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PLANTAS.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANNO  
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha:

14 MARZO 2023

No.

02

SE PONE A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL SITIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS UBICADO EN LA TENENCIA DE EL ORDENADOR DE RIVERA DEL MUNICIPIO DE TIZIHO MULHOCÁN Y SE CONSTATA QUE LA CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE TAZO Y NIVELACIÓN CON UNA META DE 146.00 M<sup>2</sup>, PARA LA POSTERIOR EXCAVACIÓN DE LA CATA SEGUN MEDIDAS DEL PROYECTO.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ R.  
SUPERVISOR DE OBRA

17 MARZO 2023

03

CON LA PRESENTE NOTA DE BITÁCORA SE HACE CONSTAR QUE SE REALIZÓ VISITA DE OBRA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA VERIFICAR EL TAZO CORRESPONDIENTE, AL TIEMPO QUE SE OBSERVA A LA CONTRATISTA CONCLUIR LOS TRABAJOS RELACIONADOS A EXCAVACIÓN, CON UN TOTAL DE 7.00 M DE ANCHO POR UNA META DE 28.00 ML DE LA CALLE, ADEMÁS YA SE CUENTA CON EL MATERIAL FILTRO PARA SER COLOCADO Y ENTENDIDO UNA VEZ AFINADO Y COMPACTADO EL TERRENO NATURAL.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha:

24 TIANZO 2023

No.

04

CON ESTA FECHA SE REALIZA UNA NUEVA VISTA DE SUPERVISIÓN AL LUGAR DE LA OBRA PARA VERIFICAR EL COMIENZO PROCESO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETIVO DE LA PRESENTE BITÁCORA. AL MOMENTO DE LA VISTA SE OBSERVA MAQUINARIA LABRANDO EL FILTRO YA SE CUENTA TENDIDO, BANCADO Y COMPACTADO, POR LO QUE SE RENUELA LA COMPACTACIÓN Y SE ACEPTA EL TRABAJO Y POR ÚLTIMO SE ESTÁ TERMINANDO LA PREPARACIÓN DE LA BASE HIDRAULICA PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BESARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

30 TIANZO 2023

05

AL MOMENTO DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA SE OBSERVA TRABAJANDO AL PERSONAL DE LA CONTRATISTA AFINANDO LA BASE HIDRAULICA, CON LA COMPACTACIÓN DE LA BASE CON VIBROCOMPACTADOR, Y TENDIDO DEL MATERIAL CON LA MOTOCOMPACTADORA, POR LO QUE SE PROCEDE A COMPROBAR MEDIDAS Y ESPESORES DE MATERIAL, POR LO QUE SE ACEPTA EL ESPESOR COLADO Y COMPACTACIÓN DE LA CALLE Y CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN PROYECTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BESARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA



Fecha:

31 MARZO 2023

No.

06

CON LA PRESENTE NOTA DE BITÁCORA, EL CONTRATISTA PRESENTA LA ESTIMACIÓN UNO CON UN PERIODO DEL 4/03/2023 AL 31/MARZO/2023, CON UN PORCENTAJE FÍSICO DEL 53.18 %, PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO, LA AUTORIZACIÓN PARA PODER CEDER A PAGO.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ NIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

03 ABRIL 2023

07

SE REALIZA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA ESTIMACIÓN UNO. TODOS LOS TRABAJOS MANIFESTADOS EN LA ESTIMACIÓN SE OBSERVAN EJECUTADOS DE BUENA MANERA Y CON BUENA CALIDAD POR LO QUE SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN Y SE LE DA TÍTULO PARA SU PAGO.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ NIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha:

05 ABRIL 2023

No.

08

CON LA FECHA ANTERIOR INDICADA SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN CON LOS VECINOS BENEFICIARIOS DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE, EN LA QUE SOLICITAN SE SUSPENDAN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DURANTE AL MENOS 10 DÍAS POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIOTICAS Y DADO QUE UTILIZARÁN LA VÍA A PAVIMENTAR COMO PASO PEATONAL Y VEHICULAR SE HACE MENCIÓN QUE ES EL ÚNICO ACCESO AL LUGAR DE LAS FIESTAS.

EN CONJUNTO LA CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA ACORDARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS COMPROMETIÉNDOSE LA CONTRATISTA A MEJORAR, RENIVELAR Y ACONDICIONAR LA BASE HIDRAULICA DE NUEVA CUENTA ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO.

DADO QUE RESPECTO DEL PROGRAMA DE OBRA SE CUENTA CON UNA GRAN CANTIDAD DE DÍAS A FAVORITO SE REALIZA NINGUN AJUSTE A LAS FECHAS CONTRACTUALES DE INICIO NI TERMINO DEL MISMO.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

17 ABRIL 2023

09

CON LA PRESENTE FECHA LOS VECINOS BENEFICIARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, MANIFIESTAN QUE YA SE PUEDEN CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN PUES YA CONCLUYERON SUS FIESTAS, SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA PARA QUE A LA BREVEDAD REACTIVE LOS TRABAJOS Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA



Fecha:

21 ABRIL 2023

No.

10

CON LA FECHA ANTERIOR INDICADA LA CONTRATISTA REALIZA EL PISO DE LA BASE HIDRAULICA EXISTE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL DIA LUNES QUE COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION.

DE IGUAL MANERA INDICA DE MANERA VERBAL QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE CONCLUYAN DE MANERA ANTICIPADA.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

26 ABRIL 2023

11

EN LA FECHA INDICADA SE REALIZÓ VISITA DE OBRA, SE OBSERVA QUE SE ESTA TERMINANDO DE COLAR EN PISO, SE VERIFICA LA COLOCACION DE LA MALLA ELECTRO SOLDADA ASI COMO LA CANTIDAD DE ARENA Y GRAVA POR BULTO DE CEMENTO, EL CONTRATISTA MANIFIESTA DE MANERA VERBAL EL FIN DE LOS TRABAJOS SIN EMBARGO SE LE INDICA QUE DICHO AVISO LO REALICE MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha:

27 ABRIL 2023

No.

12

CON ESTA FECHA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA EL OFICIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA Y PRESENTA LA ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO, CON UN PERÍODO DE ESTIMACIÓN DEL 01/04/2023 AL 27/04/2024 POR LO QUE SE PROCEDERÁ A PREPARAR LA VISITA POR PARTE DE PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA PARA CONSTATAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ING. HUGO ENRIQUE GUTMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA

28 ABRIL 2023

13

CON LA PRESENTE HOJA DE BITÁCORA SE HACE CONSTAR LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA VERIFICAR EL TÉRMINO DE LA OBRA COMO MENCIONA EL CONTRATISTA EN OFICIO ENTREGADO. AL LLEGAR AL SITIO SE PUEDE OBSERVAR QUE EFECTIVAMENTE LOS TRABAJOS SE TERMINARON DE MANERA ANTICIPADA LA CALLE SE ENCUENTRA COLADA, CON LOS 15 CM DE ESPESOR Y UNA META DE 73.00 ML. SE ENCUENTRA LA OBRA EN PERFECTO ESTADO SIN NINGÚN INCONVENIENTE ALLO QUE SE NECESITA LA ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO SIN NINGÚN PROBLEMA.

ING. HUGO ENRIQUE GUTMÁN BEJARANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGÓMEZ RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA



Fecha: 03 Mayo 2023

No. 14

CON LA PRESENTE NOTA DE BITÁCORA SE INFORMA QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVIADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TIZITIO, MICHOACÁN" EJECUTADOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN MENCIONADA SE CONCLUYEN DE MANERA EXITOSA EN SU TOTALIDAD.

ADemás, con esta fecha se reúnen en el H. AYUNTAMIENTO DE TIZITIO POR EL CONTRATANTE EL C. CARLOS SÁNCHEZ AVILAOS Y POR PARTE DEL CONTRATISTA EL ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BETANANO, PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA -RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM EN LA TENENCIA DEL DEVIADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TIZITIO, MICHOACÁN" RELATIVO AL CONTRATO NO. PTM/POA/2023/FED/53-AO-22 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, EL CUAL TUVO UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE MARZO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

SIN OTRO PARTICULAR Y HABIENDO EFECTUADO LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES DE FORMA ADECUADA SE DA POR CERRADA ESTA BITÁCORA DE OBRA.

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BETANANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMANUEL VILLAGómez RIVERA  
SUPERVISOR DE OBRA






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICH. 2021-2024  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+263 KM. EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"	CONTRATO: MTM/POA/2023/FED/53-AD-22	ESTIMACIÓN: 2 FIN (DOS FINIQUITO)	PERIODO: 01/ABRIL/2023 AL 27/ABRIL/2023
LOCALIDAD:	EL DEVANADOR DE RIVERA	MONTO: \$384,129.53	FECHA: 27/04/2023	

REPORTE FOTOGRÁFICO

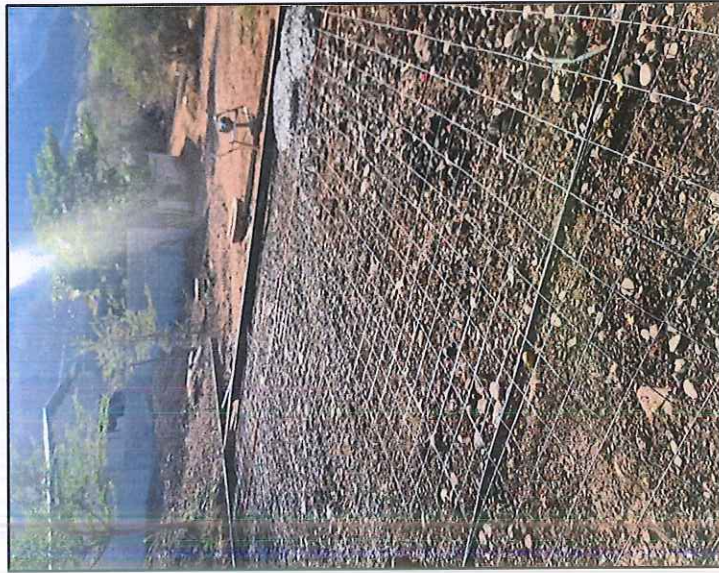

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y URBANISMO  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024  
UNIDAD Y COMPROMISO

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
PERSONA FÍSICA

C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICH. 2021-2024  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM. EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"	CONTRATO:	MTM/POA/2023/FED/53-AD-22	ESTIMACIÓN:	2 FIN (DOS FINIQUITO)	PERIODO:	01/ABRIL/2023 AL 27/ABRIL/2023
LOCALIDAD:	EL DEVANADOR DE RIVERA	MONTO:	\$384,129.53	FECHA:	27/04/2023		

REPORTE FOTOGRÁFICO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y URBANISMO  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024  
UNIDAD Y COMPROMISO

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
PERSONA FÍSICA

C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICH. 2021-2024  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"	CONTRATO:	MTM/POA/2023/FED/53-AD-22	ESTIMACIÓN:	2 FIN (DOS FINIQUITO)	PERIODO:	01/ABRIL/2023 AL 27/ABRIL/2023
LOCALIDAD:	EL DEVANADOR DE RIVERA	MONTO:	\$384,129.53	FECHA:	27/04/2023		

REPORTE FOTOGRÁFICO

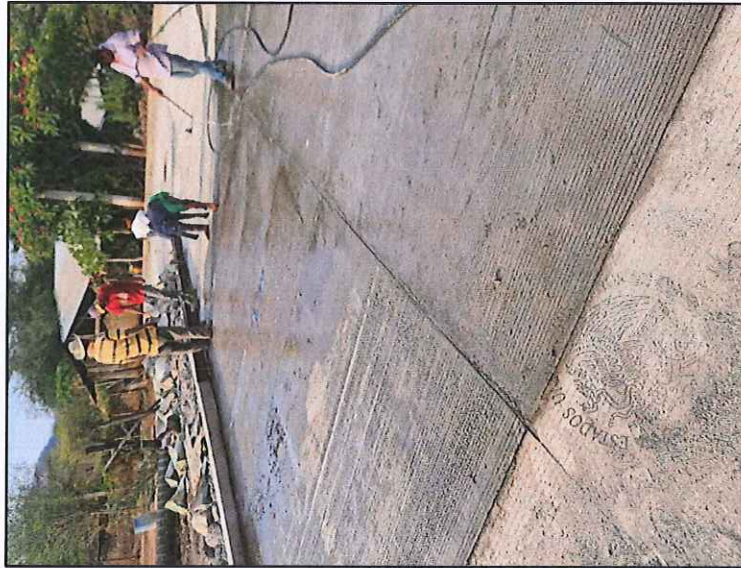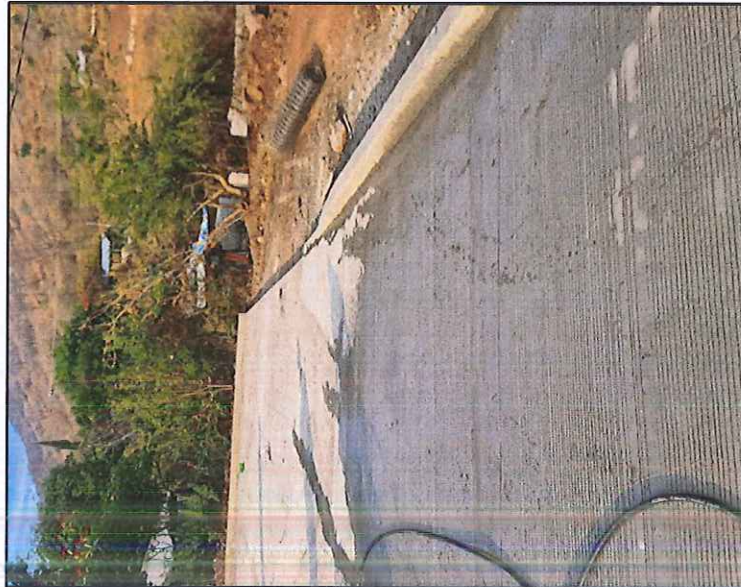

CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y URBANISMO  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024

UNIDAD Y COMPROMISO

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
PERSONA FÍSICA

G. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICH. 2021-2024  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN"	CONTRATO:	MTM/POA/2023/FED/53-AD-22	ESTIMACIÓN:	2 FIN (DOS FINIQUITO)	PERIODO:	01/ABRIL/2023 AL 27/ABRIL/2023
LOCALIDAD:	EL DEVANADOR DE RIVERA	MONTO:	\$384,129.53	FECHA:	27/04/2023		

REPORTE FOTOGRÁFICO

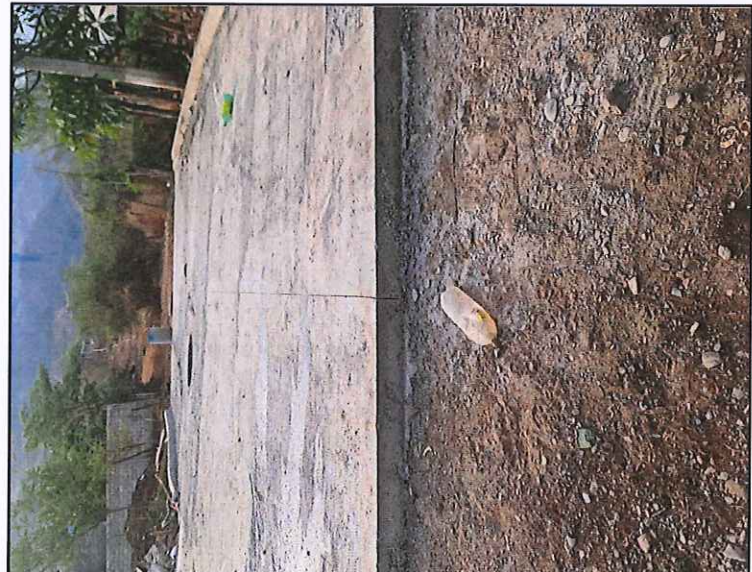

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO  
PERSONA FÍSICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y URBANISMO  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024  
UNIDAD Y COMPROMISO

C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
